

LAPTI

**SA
VI
LAH
TI.**
KUOPIO
FINLAND



VIKKOTIEDOTE

LUOLA, Savilahden liikunta- ja tapahtumakeskus vko 10/2023

Työmaatilanne

2. vaiheen työt käynnissä

Käynnissä olevat työvaiheet

- H1 seinien rauditus ja H1 parven holvin työt
- H1 maantasaustyöt
- H2 Käytäväosan lattian alle tulevien tekniikoiden asennus
- R2 maanvaraisen lattian lattialämmitysasennukset
- R2 3. krs seinän muottityöt
- R2 akoseinien asennus
- Tunneli 4 2. krs konsolien ja holvin muotti- ja rauditustyöt
- Tunneli 2 seinien muotti- ja rauditustyöt

Alkavat työvaiheet

- R2 maanvaraisten lattioiden valutyöt, vko 10-12
- T4 3. krs seinän valu, vko 11
- T4-T6 tunnelien edessä holvin teko, vko 12 alk.
- R2 3. krs katon murtett käsittely, vko 11 ma
- H2 1.-2. krs + T1 putsityöt, vko 11 alk.
- H2 2. krs kipsiväliseinät, vko 12
- H2 1. krs maalaus- ja tasoitetyöt, vko 13/14

LAPTI

**SA
VI
LAH
TI.**
KUOPIO
FINLAND



VIKKOTIEDOTE

Työturvallisuus

TR-mittaus vko 10: 96.71%

TR-mittarin avulla arvioidaan rakennustyömaan työturvallisuutta.

Työmaan terveiset

"Työmaa etenee aikataulun mukaisesti", kertoo vastaava työnjohtaja *Petteri Ovaska*.



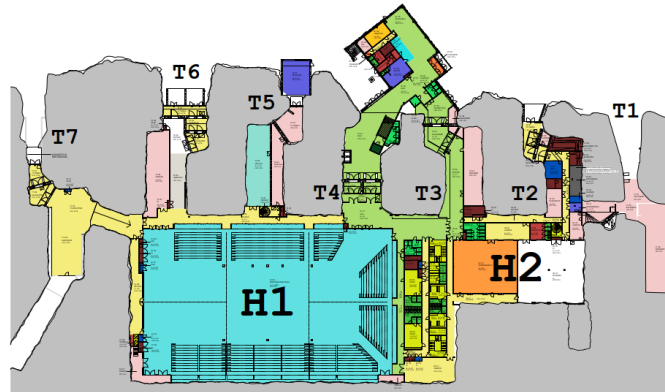
R2 lattialämmitysasennukset aloitettu.

LAPTI**SA
VI
LAH
TI.**
KUOPIO
FINLAND

VIKKOTIEDOTE



H1 maantasaustyöt käynnissä.

LAPTI**SA
VI
LAH
TI.**
KUOPIO
FINLAND

VIKKOTIEDOTE



H1 alue kuvattuna R2 holvilta.
