

# LAPTI

**SA  
VI  
LAH  
TI.**  
KUOPIO  
FINLAND



Aluemerkinnt		
T1 - T7	=	Tunnelit 1-7
R1	=	Rakennus 1 (sisäänkäyntirakennus)
R2	=	Rakennus 2
H1	=	Halli 1
H2	=	Halli 2

## VIKKOTIEDOTE

### LUOLA, Savilahden liikunta- ja tapahtumakeskus vko 16/2023

#### Työmaatilanne


2. vaiheen työt käynnissä

#### Käynnissä olevat työvaiheet

- H1 Maanvaraisen lattian asennustyöt
- H1 Sprinkleriasennukset
- Tunneli7 400 mm paksun seinän muotti- ja raudoitustyöt
- Tunneli4 Maanvaraisen lattian asennustyöt
- Tunneli2 400 mm paksun seinän muotti ja raudoitustyöt
- R2 1Krs Akoseinien asennus
- R2 1Krs Betonipintojen jälkityöt
- R2 2Krs Sosiaalitilojen kallistuvalut maakostealla betonilla
- R2 3Krs Kevyiden väliseinien asennustyöt
- R2 3Krs Tasoite ja maalaustyöt
- H2 1Krs Tasoite ja maalaustyöt
- H2 2Krs Kevyiden väliseinien asennustyöt
- H2-R2 Käytävän maanvaraisen lattian asennustyöt
- R1 Maanrakennustyöt

# LAPTI

**SA  
VI  
LAH  
TI.**  
KUOPIO  
FINLAND

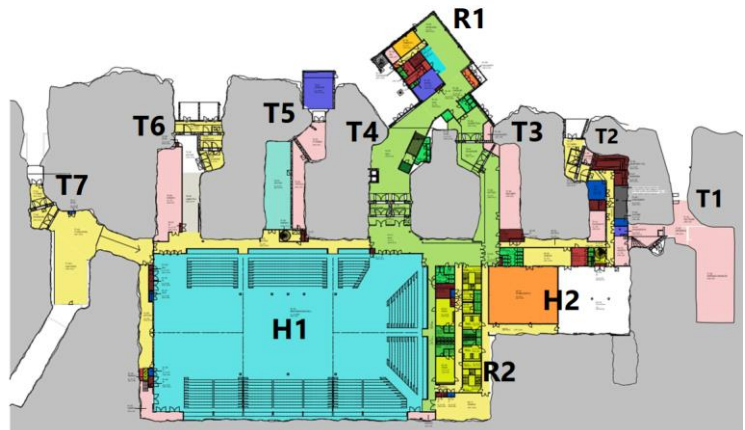

#### Aluemerkinnt

T1 - T7 =  
R1 =  
R2 =  
H1 =  
H2 =

#### Tunnelit 1-7

Rakennus 1 (sisäänkäyntirakennus)  
Rakennus 2  
Halli 1  
Halli 2

## VIKKOTIEDOTE

### Alkavat työvaiheet

- Murtett-käsittelyt tunneleihin vko 16
- R2 3Krs Terästolppien asennus vko 17
- R2 3Krs Paroc-asennus vko 17
- R1 anturoiden teko vko 17 alk.
- T3 ja T4 sekä H2 käytävän lattiatyöt vko 16 alk.

### Työturvallisuus

TR-mittaus vko 16 97,70 %.


TR-mittarin avulla arvioidaan rakennustyömaan työturvallisuutta.

### Työmaan terveiset

Työmaa etenee aikataulun mukaisesti.

# LAPTI

**SA  
VI  
LAH  
TI.**  
KUOPIO  
FINLAND

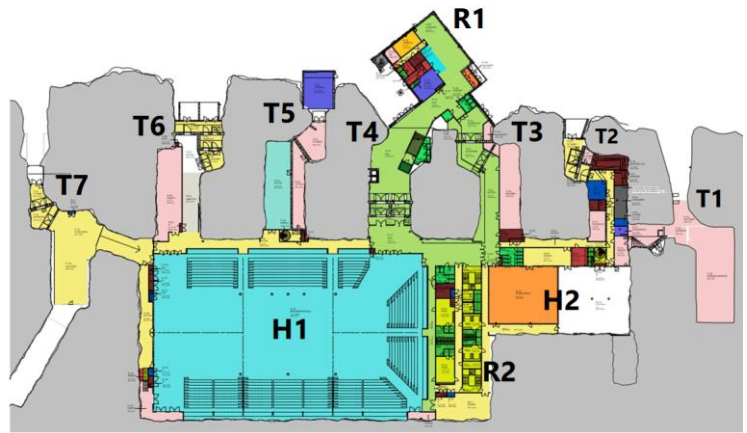

#### Aluemerkinnt

T1 - T7

R1

R2

H1

H2

=

=

=

=

=

Tunnelit 1-7

Rakennus 1 (sisäänkäyntirakennus)

Rakennus 2

Halli 1

Halli 2


## VIKKOTIEDOTE



*Kuva 1: R2 käytäviä valettu.*

# LAPTI

**SA  
VI  
LAH  
TI.**  
KUOPIO  
FINLAND

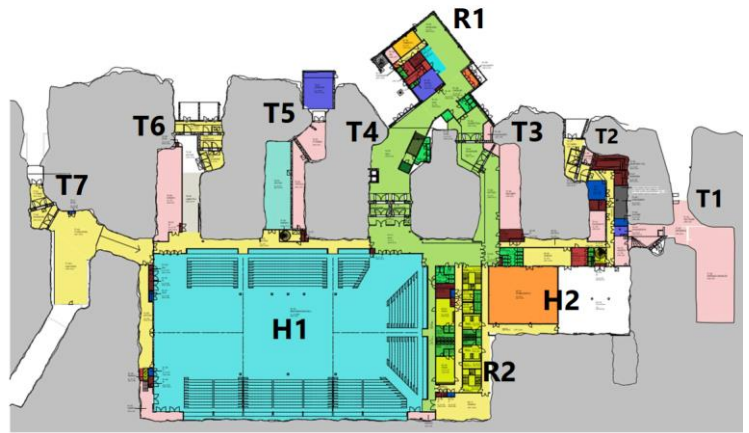

#### Aluemerkinnt

T1 - T7

R1

R2

H1

H2

=

=

=

=

=

Tunnelit 1-7

Rakennus 1 (sisääkäyntirakennus)

Rakennus 2

Halli 1

Halli 2


## VIKKOTIEDOTE



*Kuva 2: H2 väliseinätyöt etenevät.*

# LAPTI

**SA  
VI  
LAH  
TI.**  
KUOPIO  
FINLAND

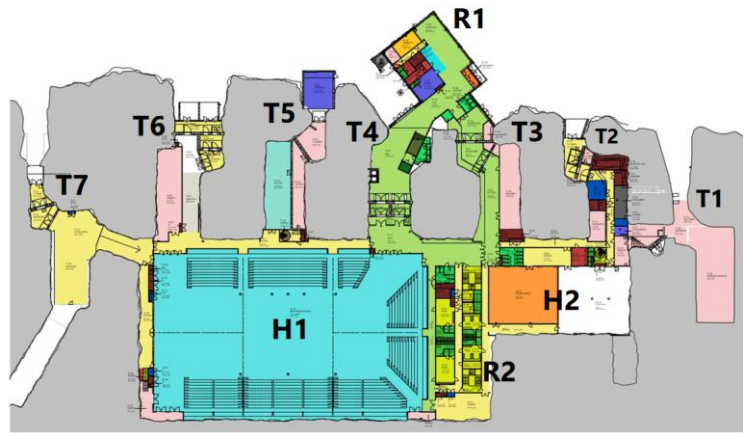

#### Aluemerkinnt

T1 - T7	=	Tunnelit 1-7
R1	=	Rakennus 1 (sisäänkäyntirakennus)
R2	=	Rakennus 2
H1	=	Halli 1
H2	=	Halli 2

## VIKKOTIEDOTE



Kuva 3: työmaalla asennettu väliaikaisia osastoivia ovia.
