

LAPTI

**SA
VI
LAH
TI.**
KUOPIO
FINLAND



Aluemerkinnät		
T1 - T7	=	Tunnelit 1-7
R1	=	Rakennus 1 (sisäänkäyntirakennus)
R2	=	Rakennus 2
H1	=	Halli 1
H2	=	Halli 2

VIKKOTIEDOTE

LUOLA, Savilahden liikunta- ja tapahtumakeskus vko 18/2023

Työmaatilanne

2. vaiheen työt käynnissä

Käynnissä olevat työvaiheet


- H1: maanvaraisen lattian asennustyöt
- H1: sprinkleri-asennukset
- Tunneli 2: VSS seinien muotti- ja raudoitustyöt
- Tunneli 6: VSS seinien muotti- ja raudoitustyöt
- Tunneli 7: maanrakennustyöt ja tekniikka-asennukset
- R2: 1. krs betonipintojen jälkityöt
- R2: 1.-2.krs palokatkosaumaukset
- R2: 3. krs tasoite- ja maalaustyöt
- R2: 3. krs Paroc-asennus
- H2: 1. krs tasoite- ja maalaustyöt
- H2: 2. krs kevyiden väliseinien asennustyöt
- H2-R2: käytävän maanvaraisen lattian asennustyöt
- R1: maanrakennustyöt ja perustustyöt käynnissä

Alkavat työvaiheet

- H2: 1. krs LVIS-asennukset vko 19
- H1: yhteiskannakointijärjestelmän asennus vko 21

LAPTI

**SA
VI
LAH
TI.**
KUOPIO
FINLAND

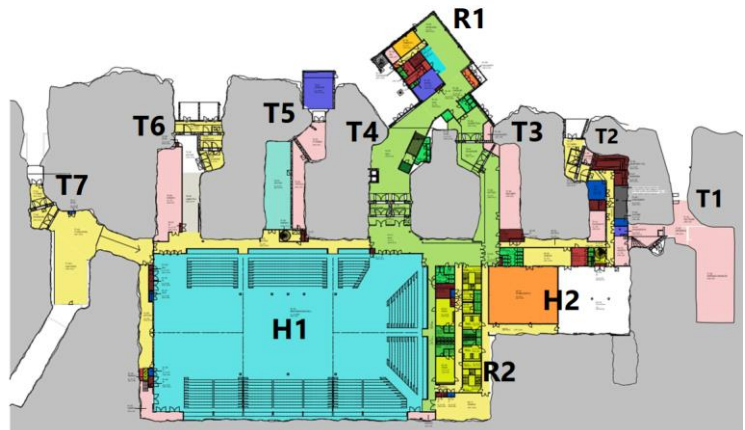

Aluemerkinnät

T1 - T7 =

R1 =

R2 =

H1 =

H2 =

Tunnelit 1-7

Rakennus 1 (sisäänkäyntirakennus)

Rakennus 2

Halli 1

Halli 2

VIKKOTIEDOTE

Työturvallisuus

TR-mittaus vko 17: 98,18 %

TR-mittauksen suoritti Aluehallintoviraston tarkastaja ja kyseessä oli valtakunnallinen työturvallisuuskilpailumittaus.


TR-mittarin avulla arvioidaan rakennustyömaan työturvallisuutta.

Työmaan terveiset

Työmaa etenee aikataulun mukaisesti.

LAPTI

**SA
VI
LAH
TI.**
KUOPIO
FINLAND

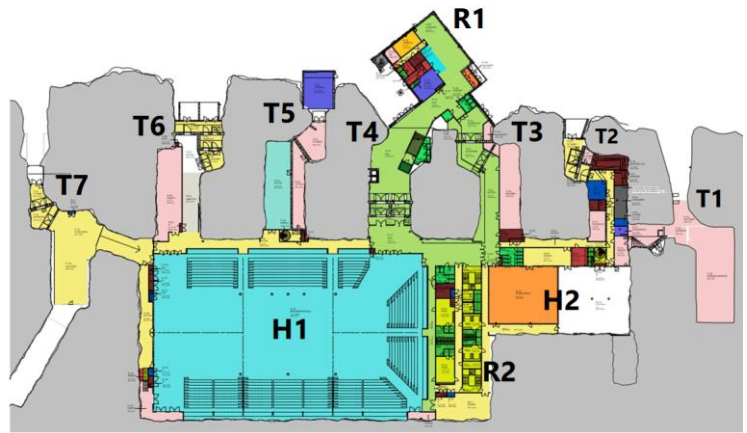

Aluemerkinnt

T1 - T7	=	Tunnelit 1-7
R1	=	Rakennus 1 (sisäänkäyntirakennus)
R2	=	Rakennus 2
H1	=	Halli 1
H2	=	Halli 2


VIKKOTIEDOTE



R2-alueella laastinsekoituspiste

LAPTI

**SA
VI
LAH
TI.**
KUOPIO
FINLAND

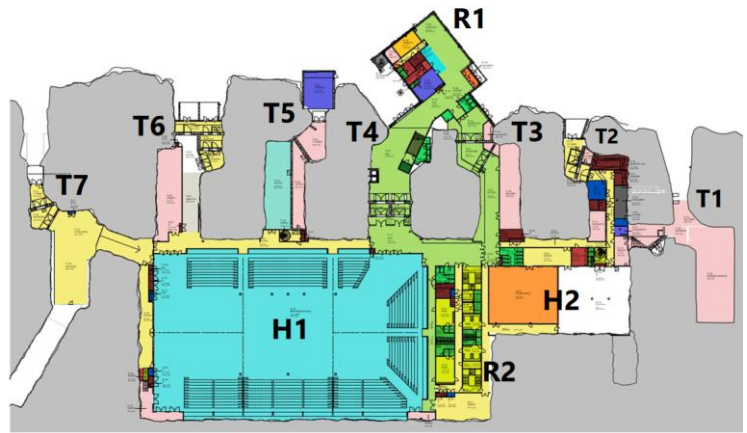

VIKKOTIEDOTE

Aluemerkinnät

T1 - T7

R1

R2

H1

H2

=

=

=

=

=

Tunnelit 1-7

Rakennus 1 (sisäänkäyntirakennus)

Rakennus 2

Halli 1

Halli 2



R2: 3. krs terästyöt ja Paroc-asennukset käynnissä
