


LAPTI

**SA
VI
LAH
TI.**
KUOPIO
FINLAND

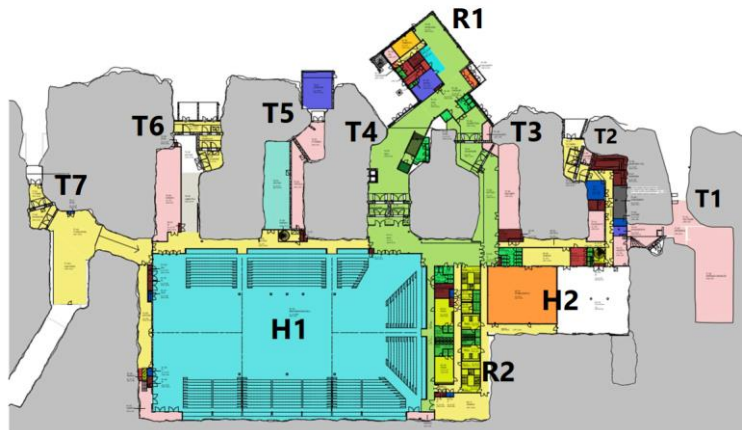

Aluemerkinnt

T1 - T7	=	Tunnelit 1-7
R1	=	Rakennus 1 (sisäänkäyntirakennus)
R2	=	Rakennus 2
H1	=	Halli 1
H2	=	Halli 2

VIKKOTIEDOTE

LUOLA, Savilahden liikunta- ja tapahtumakeskus vko 19/2023

Työmaatilanne


2. vaiheen työt käynnissä

Käynnissä olevat työvaiheet

- H1: maanvaraisen lattian asennustyöt
- Maanvaraisen lattian asennus tunneleiden 3 ja 4 edustalla
- H1+R2: katon sprinklerin ja LVI-kannatustappien sekä sähköturvahyllyn kannatuksien poraus
- H1: sprinkleri-asennukset
- Tunneli 7: maanrakennustyöt ja tekniikan asennus
- Tunneli 7: sepelitäytöt ja lattian alle tulevan tekniikan asennus
- Tunneli 6: VSS seinien muotti- ja raudoitustyöt sekä läpivientien asennus
- Tunneli 5: jätekatoksen perustuksien muotti- ja raudoitustyöt
- Tunneli 2: seinien muotti- ja raudoitustyöt
- R2: 1. krs betonipintojen jälkityöt
- R2: 1. krs LVI-asennukset
- R2: 1. krs tasoite- ja maalaustyöt
- R2: 1.-2. krs palokatko- ja saumaukset
- R2: 3. krs IVKH kammioiden Paroc-asennus
- R2: 3. krs IVKH sprinkleriasennukset
- H2: 1. krs IV-asennukset
- H2: 2. krs kevyiden väliseinien asennustyöt
- R1: maanrakennustyöt, viemäreiden ja salaojien asennus
- R1: perustuksien muotti- ja raudoitustyöt

LAPTI

**SA
VI
LAH
TI.**
KUOPIO
FINLAND

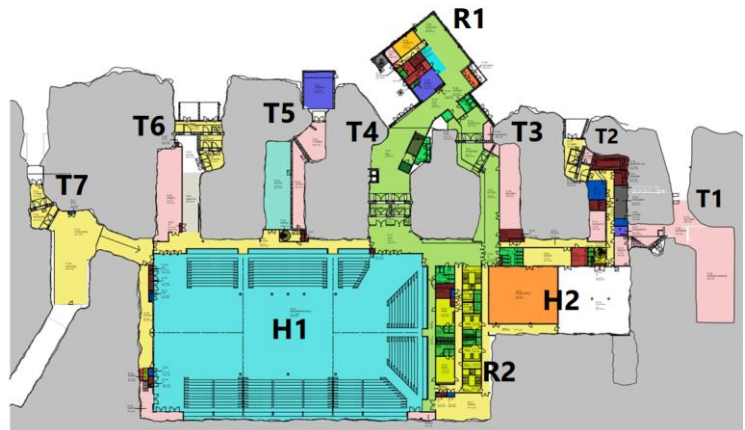

Aluemerkinnt

T1 - T7	=	Tunnelit 1-7
R1	=	Rakennus 1 (sisäänkäyntirakennus)
R2	=	Rakennus 2
H1	=	Halli 1
H2	=	Halli 2

VIKKOTIEDOTE

Alkavat työvaiheet

- R1: runkotyöt, vko 20
- H:1 yhteiskannakointijärjestelmän asennus, vko 21
- R2: 3. krs IVKH pinnoitustyöt, vko 21
- R2: 3. krs IVKH asennukset, vko 23

Työturvallisuus

TR-mittaus vko 18: 97,41 %


TR-mittarin avulla arvioidaan rakennustyömaan työturvallisuutta.

Työmaan terveiset

Työmaa etenee aikataulun mukaisesti.

LAPTI

**SA
VI
LAH
TI.**
KUOPIO
FINLAND

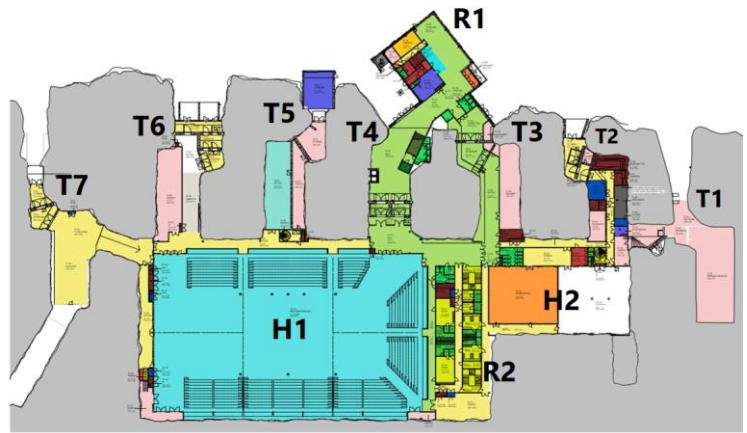

VIKKOTIEDOTE

Aluemerkinnt

T1 - T7

R1

R2

H1

H2

=

=

=

=

=

Tunnelit 1-7

Rakennus 1 (sisäänkäyntirakennus)

Rakennus 2

Halli 1


Halli 2



H2-alueella osastointiseiniä

LAPTI

**SA
VI
LAH
TI.**
KUOPIO
FINLAND

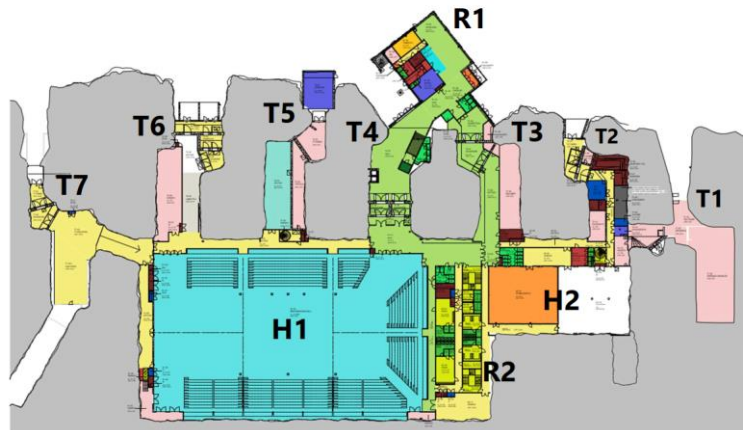

Aluemerkinnt

T1 - T7	=	Tunnelit 1-7
R1	=	Rakennus 1 (sisäänkäyntirakennus)
R2	=	Rakennus 2
H1	=	Halli 1
H2	=	Halli 2


VIKKOTIEDOTE



T4 ja T3 välisellä alueella lattiatyöt käynnissä

LAPTI

**SA
VI
LAH
TI.**
KUOPIO
FINLAND

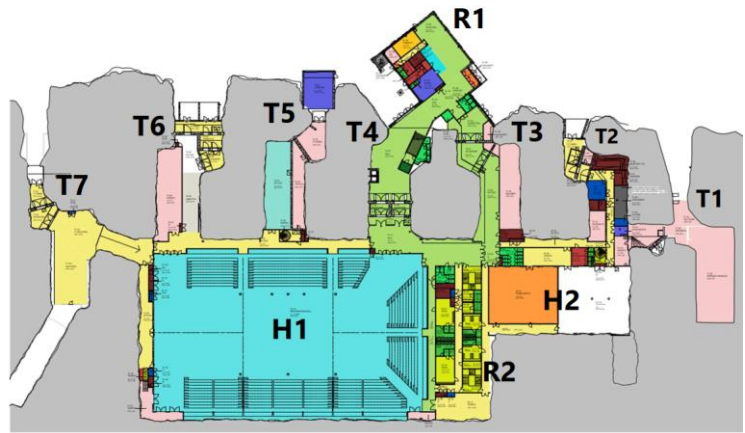

Aluemerkinnt

T1 - T7	=	Tunnelit 1-7
R1	=	Rakennus 1 (sisäänkäyntirakennus)
R2	=	Rakennus 2
H1	=	Halli 1
H2	=	Halli 2

VIKKOTIEDOTE



H2: 2. krs väliseinätyöt pääosin valmistuneet
