

# LAPTI

**SA  
VI  
LAH  
TI.**  
KUOPIO  
FINLAND



<b>Aluemerkinnt</b>	=	<b>Tunnelit 1-7</b>
T1 - T7	=	<b>Rakennus 1 (sisäänkäyntirakennus)</b>
R1	=	<b>Rakennus 2</b>
R2	=	<b>Halli 1</b>
H1	=	<b>Halli 2</b>
H2	=	

## VIKKOTIEDOTE


### LUOLA, Savilahden liikunta- ja tapahtumakeskus vko 28/2023

#### Työmaatilanne

#### 2. vaiheen työt käynnissä

#### Käynnissä olevat työvaiheet

- H1: katon yhteiskannakointijärjestelmän asennustyöt
- H1: katon vesivuotojen injektioinnit
- H1, tunneli 4 edustalla IV-kanavien asennus
- Tunneli 7: ampumaradan purkutyöt
- Tunneli 6: VSS 800 poikittaisseinän ja kanaalien muotti- ja raudoitustyöt
- Tunneli 2: kanaalien muotti- ja raudoitustyöt
- Tunneli 2: Ako-seinien asennus
- Tunneli 1: ulkopuolisten seinien muotti- ja raudoitustyöt
- R2: 1. krs sähköasennukset
- R2: 1. krs laatoitustyöt
- R2: 1. krs LVI-eristystyöt
- R2: 2. krs LVI-asennukset
- R2: 2. krs IV-kanava-asennukset
- R2 ja H2: 1.-2. krs palokatkosaumaukset
- H2: 1. krs sähköasennukset
- H2 ja R2: 1.-2. krs sprinkleriasennukset
- H2-R2: 1. krs (T3->T6) edustan käytävän LVI-asennukset
- H2: 1. krs wc ja sos. tilojen tasoite- ja maalaustyöt
- H2: 2. krs IV-asennukset
- R1: sisätäytöt

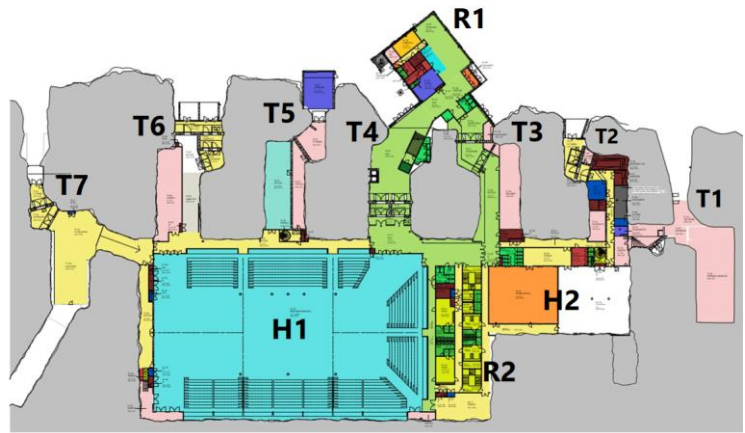

## VIKKOTIEDOTE

### Aluemerkinnt

T1 - T7	=	Tunnelit 1-7
R1	=	Rakennus 1 (sisäänkäyntirakennus)
R2	=	Rakennus 2
H1	=	Halli 1
H2	=	Halli 2

## Alkavat työvaiheet

- Tunneli 6: maanvaraisen lattian eristys- ja raudoitustyöt vko 29
- H1, tunneli 6 edustan IV-asennukset vko 31
- R2: 3. krs IV-asennus vko 29
- Piha-alueen maanrakennustyöt T1->T5
- R1: Paroc-asennukset vko 29

## Työturvallisuus

TR-mittaus vko 27: 98,09 %.


TR-mittarin avulla arvioidaan rakennustyömaan työturvallisuutta.

## Työmaan terveiset

Työmaan väki toivottaa kaikille hyvää kesää ja kesälomansa aloittaneille hyvää lomaa.

# LAPTI

**SA  
VI  
LAH  
TI.**  
KUOPIO  
FINLAND

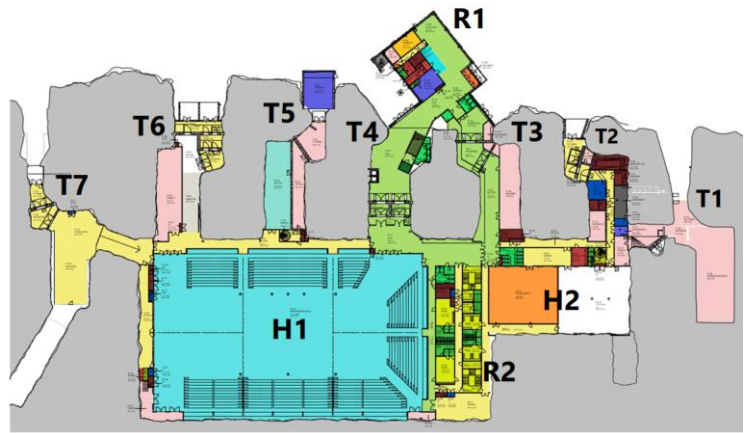

#### Aluemerkinnt

T1 - T7	=	Tunnelit 1-7
R1	=	Rakennus 1 (sisäänkäyntirakennus)
R2	=	Rakennus 2
H1	=	Halli 1
H2	=	Halli 2

## VIKKOTIEDOTE




*H2: 2. kerroksen alue valmiina ilmanvaihtosennuksia varten.*



# LAPTI

**SA  
VI  
LAH  
TI.**  
KUOPIO  
FINLAND

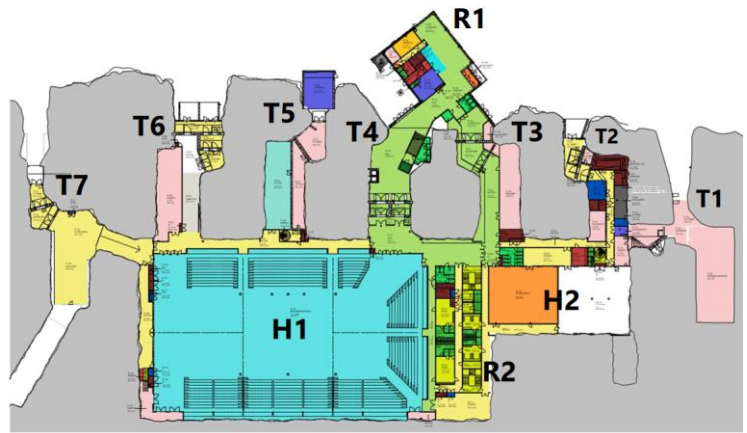

#### Aluemerkinnt

T1 - T7	=	Tunnelit 1-7
R1	=	Rakennus 1 (sisäänkäyntirakennus)
R2	=	Rakennus 2
H1	=	Halli 1
H2	=	Halli 2

## VIKKOTIEDOTE



R1: sisätäytöt lähestyvät loppuaan.
