

LAPTI

**SA
VI
LAH
TI.**
KUOPIO
FINLAND



Aluemerkinnot		
T1 - T7	=	Tunnelit 1-7
R1	=	Rakennus 1 (sisäänkäyntirakennus)
R2	=	Rakennus 2
H1	=	Halli 1
H2	=	Halli 2

VIKKOTIEDOTE

LUOLA, Savilahden liikunta- ja tapahtumakeskus vko 33/2023

Työmaatilanne

2. vaiheen työt käynnissä

Käynnissä olevat työvaiheet


- H1 ja H2: katon vesivuotojen injektoinnit
- H2: 1.krs käytävän tasoite- ja maalaustyöt
- R2 ja H2: 1.-2. krs palokatkosaumukset
- R2: 2. krs vedeneristystyöt ja laatoitustyöt
- R2: 1. krs ja H2 2. krs LVI-eristystyöt
- R2 ja H2: 2. krs sprinkleriasennukset
- R1: maanvaraisen lattian betonointityöt
- IV-asennus: H2 2. krs, R2 3. krs IVKH-asennus
- LV-asennus: H2-R2 1. krs (T3->T6) edustan käytävän LV-asennukset
- Sähkö-asennus: R2 1. krs sähköasennukset, R2 2. krs hyllyasennus
- Tunneli 6: ulkopuolisten VSS-seinien muuttityöt
- Tunneli 5: porrashuoneen kipsilevyväliseinien asennustyöt
- Tunneli 3: lämmönjakuhuoneen asennukset
- Tunneli 2: kanaalien ympärysten täyttö ja eristystyöt
- Pihan kaivuutyöt sekä tekniikan asennus tunneleiden 1-3, sekä tunneli 6 edustalla

Alkavat työvaiheet

- H2: portaan asennus vko 34
- R1: vesikattotyöt vko 35 alk.
- T5: portaan asennus vko 35
- Lattioiden pinnoitustyöt (R2 ja H2) vko 35 alk.

LAPTI

**SA
VI
LAH
TI.**
KUOPIO
FINLAND

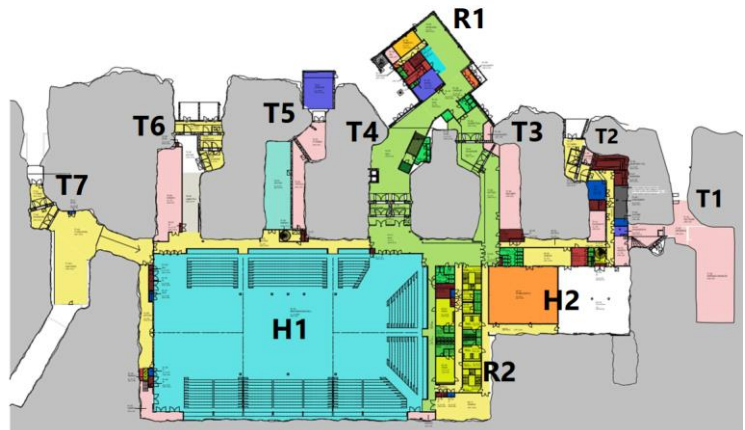

Aluemerkinnt

T1 - T7	=	Tunnelit 1-7
R1	=	Rakennus 1 (sisäänkäyntirakennus)
R2	=	Rakennus 2
H1	=	Halli 1
H2	=	Halli 2

VIKKOTIEDOTE

- Alakattotyöt R2 ja H2 vko 35
- R2: portaan teräsrunkojen asennus vko 33 ja 34
- T2: lattian asennustyöt vko 34-> valu vko 35 Ti-asennus H1 katossa
- H2: portaan asennus
- R1: vesikattotyöt
- T5: portaan asennus
- R2 ja H2 alueiden lattioiden pinnoitustyöt
- Alakattotyöt elokuun lopulla
- Automaatiotyöt elokuun lopulla

Työturvallisuus

TR-mittaus vko 32: 98,46 %


TR-mittarin avulla arvioidaan rakennustyömaan työturvallisuutta. Lyhenne TR tulee sanasta talonrakennus.

Työmaan terveiset

Työt etenevät aikataulun mukaisesti ja työmaalla juhlitaan harjannostajaisia syyskuussa.

LAPTI

**SA
VI
LAH
TI.**
KUOPIO
FINLAND

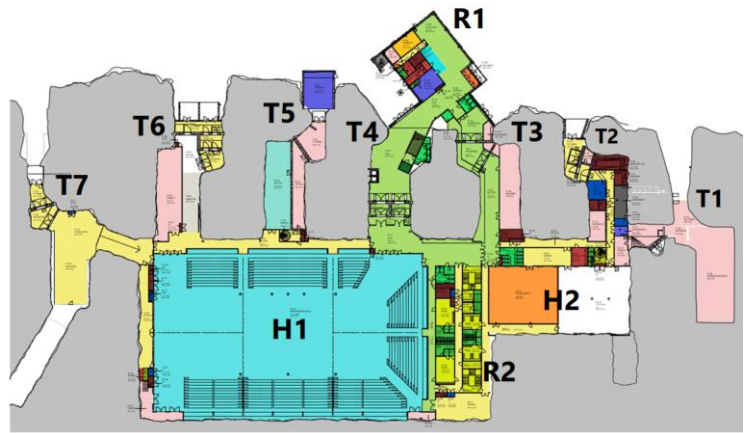

VIKKOTIEDOTE

Aluemerkinnt


T1 - T7	=	Tunnelit 1-7
R1	=	Rakennus 1 (sisäänkäyntirakennus)
R2	=	Rakennus 2
H1	=	Halli 1
H2	=	Halli 2



R1: lattian valutyöt ovat valmistuneet.

LAPTI

**SA
VI
LAH
TI.**
KUOPIO
FINLAND

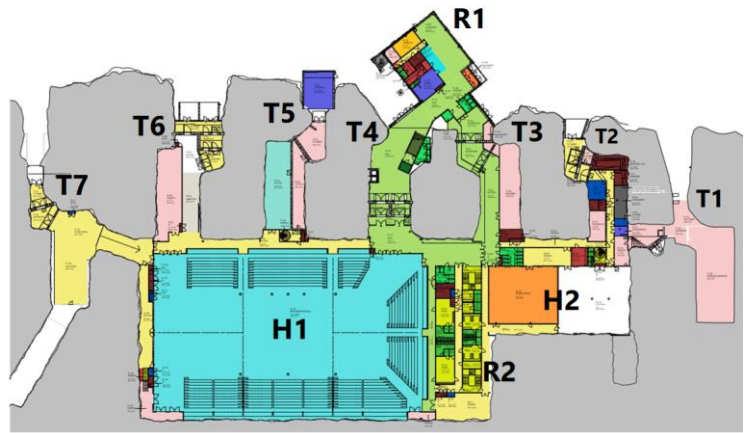

VIKKOTIEDOTE

Aluemerkinnt

T1 - T7 =
R1 =
R2 =
H1 =
H2 =

Tunnelit 1-7
Rakennus 1 (sisäänkäyntirakennus)
Rakennus 2
Halli 1
Halli 2



R1: sääsuojan asennus on käynnissä.
