

LAPTI

**SA
VI
LAH
TI.**
KUOPIO
FINLAND



Aluemerkinnt		
T1 - T7	=	Tunnellit 1-7
R1	=	Rakennus 1 (sisäänkäyntirakennus)
R2	=	Rakennus 2
H1	=	Halli 1
H2	=	Halli 2

VIKKOTIEDOTE

LUOLA, Savilahden liikunta- ja tapahtumakeskus vko 38/2023

Työmaatilanne


2. vaiheen työt käynnissä

Käynnissä olevat työvaiheet

- H1 + H2+T2-T3 katon vesivuotojen injektioinnit
- H1 IV-asennukset ja eristystyöt
- H2 1. krs wc-tilojen vedeneristys- ja laatoitustyöt
- R2 1.-3. krs ja H2 1.-2. krs sekä T4 3. krs palokatkosaumaukset
- R2 1. krs sos-tilojen lattioiden pinnoitustyöt
- R2 1.-2. krs alakattojen tekniikkalevyjen asennus ja akustiikkalevyjen asennus
- R2 2.-3. krs ja H2 2. krs LVI-eristystyöt
- R1 vesikattotyöt T3 ja T4 kohdalla
- R1 1. krs loput kipsiväliseinät ja otsapinnat
- R1 1. krs maalaus- ja tasoitetyöt
- IV-asennus: H2 2. krs, R2 3. krs IVKH-asennus
- LV-asennus: H2-R2 1. krs (T2->T7) edustan käytävän LV-asennukset + patteriasennukset sekä R1 viemärit ja peksiputkien asennus
- Sähkö-asennus: H1+H2-R2 1.-2. krs sähköasennukset ja hyllyasennus
- Tunneli 2 1. krs tasoite- ja maalaustyöt
- Tunneli 3 lämmönjakohuoneen asennukset
- Tunneli 4 wc-tilojen vedeneristys ja laatoitustyöt
- Tunnelit 2-5 sprinkleriasennukset
- Tunneli 6 ulkopuolisen VSS-holvin muotti- ja raudoitustyöt
- Tunneli 7 LVI-asennukset
- Tunneli 7 parven alakaton koolaus ja eristystyöt
- Pihan kaivuutyöt sekä tekniikan asennus tunneleiden 6-7 välinen alue

LAPTI

**SA
VI
LAH
TI.**
KUOPIO
FINLAND

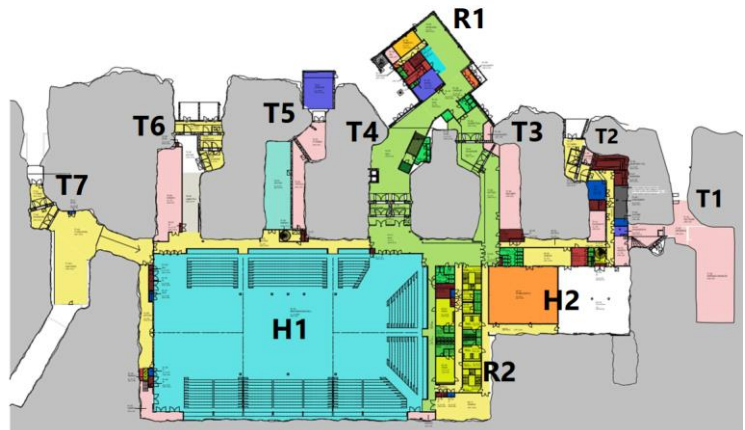

Aluemerkinnt

T1 - T7 =
R1 =
R2 =
H1 =
H2 =

Tunnelit 1-7

Rakennus 1 (sisäänkäyntirakennus)
Rakennus 2
Halli 1
Halli 2

VIKKOTIEDOTE

Alkavat työvaiheet

- R2-H2 betonilattioiden hionnat ja pinnoitukset vko 39
- Verkkoseinien runkojen asennus T3 ja T4 vko 39
- Piha-alueen työt, reunakivetyksiä yms. vko 40/41
- Sääsuojan purkutyöt vko 40 ti-ke aloitus
- Julkisivujen lasitus sääsuojan jälkeen vko 41

Työturvallisuus

TR-mittaus vko 38: 97,89 %


TR-mittarin avulla arvioidaan rakennustyömaan työturvallisuutta.

Työmaan terveiset

Työt etenevät aikataulun mukaisesti.

LAPTI

**SA
VI
LAH
TI.**
KUOPIO
FINLAND

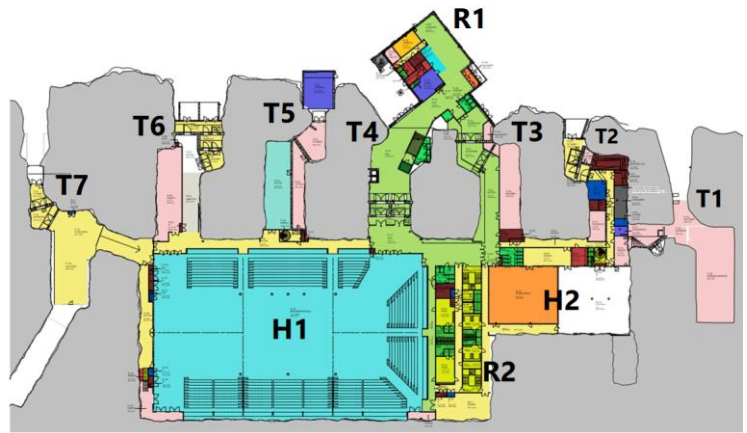

Aluemerkinnot

T1 - T7 =
R1 =
R2 =
H1 =
H2 =

Tunnelit 1-7
Rakennus 1 (sisäänkäyntirakennus)
Rakennus 2
Halli 1
Halli 2


VIKKOTIEDOTE



H2 1. krs alakattorunkoja asennettu

LAPTI

**SA
VI
LAH
TI.**
KUOPIO
FINLAND

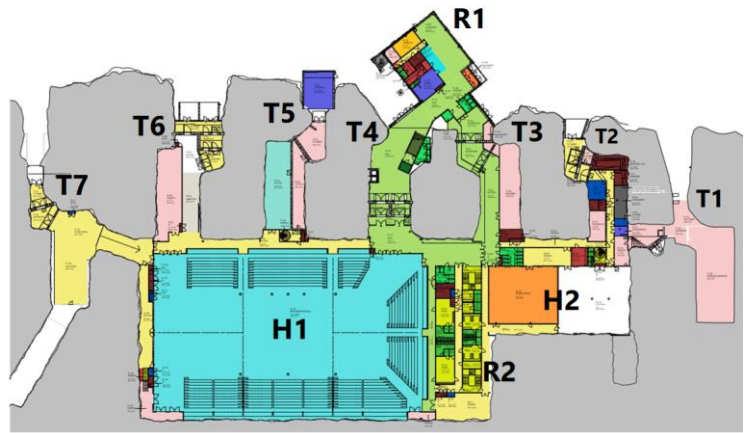

Aluemerkinnät

T1 - T7

R1

R2

H1

H2

=

=

=

=

=

Tunnelit 1-7

Rakennus 1 (sisäänkäyntirakennus)

Rakennus 2

Halli 1

Halli 2

VIKKOTIEDOTE



R1 väliseinätyöt käynnissä
