


LAPTI

**SA
VI
LAH
TI.**
KUOPIO
FINLAND

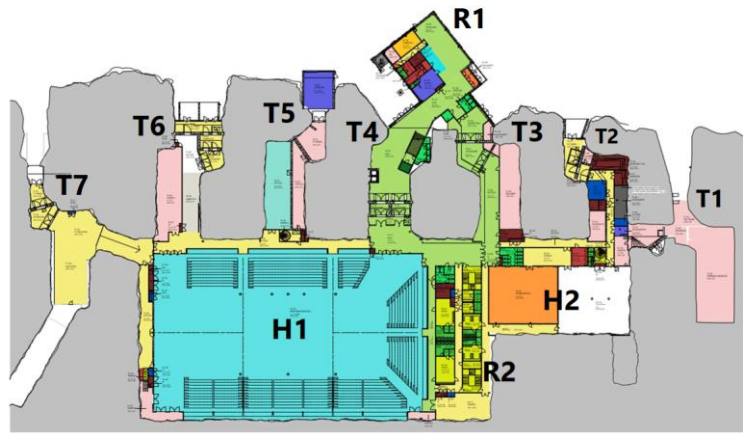

Aluemerkinnt

T1 - T7	=	Tunnellit 1-7
R1	=	Rakennus 1 (sisäänkäyntirakennus)
R2	=	Rakennus 2
H1	=	Halli 1
H2	=	Halli 2

VIKKOTIEDOTE

LUOLA, Savilahden liikunta- ja tapahtumakeskus Vko 39/2023

Työmaatilanne


2. vaiheen työt käynnissä

Käynnissä olevat työvaiheet

- H1 + H2+T2-T3 Katon vesivuotojen injektioinnit
- H1 IV asennukset ja eristystyöt
- H2 1krs WC tilojen Vedeneristys-ja laatoitustyöt
- R2 1-3Krs ja H2 1-2Krs sekä T4 3Krs Palokatkosaumaukset
- R2 1Krs Sos tilojen lattioiden pinnoitustyöt
- R2 1-2Krs Alakattojen tekniikkalevyjen asennus ja akustiikkalevyjen asennus
- R2 2-3Krs ja H2 2 krs LVI eristystyöt
- R1 vesikattotyöt T3 ja T4 kohdalla
- R1 Huoltosillan teräsrakennetyöt
- R1 1Krs Loput kipsiväliseinät ja otsapinnat
- R1 1Krs Maalaus ja tasoitetyöt
- IV-asennus: H2 2 krs, R2 3Krs IVKH- asennus
- LV-asennus:H2-R2 1Krs (T2->T7) edustan Käytävän LV asennukset + patteri asennukset sekä R1 viemärit ja peksiputkien asennus
- Sähkö-asennus: H1+H2-R2 1-2Krs Sähköasennukset ja hyllyasennus
- Tunneli 2 1Krs Tasoite- ja maalaustyöt
- Tunneli 2 Vss seinien ulkopuoliset alueet ruiskubetonointi
- Tunneli 3 lämmönjakohuoneen asennukset
- Tunneli 4 Wc tilojen vedeneristys ja laatoitustyöt
- Tunnelit 3-5 VSS sähkölaippojen asennus
- Tunnelit 2-5 Sprinkleri asennukset
- Tunneli 6 ulkopuolisen Vss Holvin betonointityöt

LAPTI

**SA
VI
LAH
TI.**
KUOPIO
FINLAND

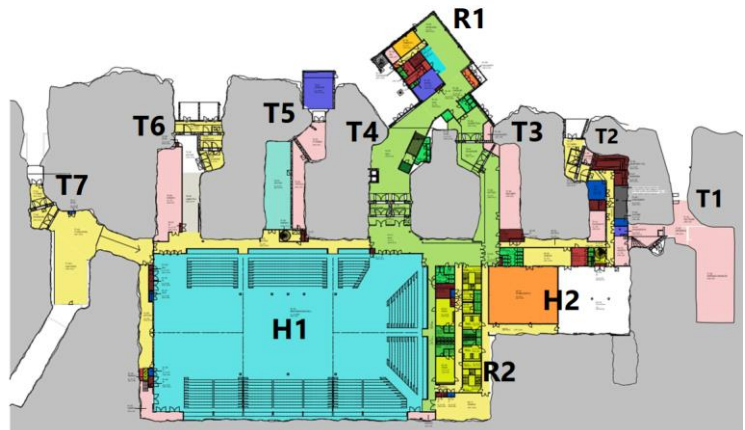

Aluemerkinnt

T1 - T7	=	Tunnelit 1-7
R1	=	Rakennus 1 (sisäänkäyntirakennus)
R2	=	Rakennus 2
H1	=	Halli 1
H2	=	Halli 2

VIKKOTIEDOTE

- Tunneli 7 LVI asennukset
- Pihan kaivuutyöt sekä tekniikan asennus Tunneleiden 6-7 välinen alue

Alkavat työvaiheet

- Piha-alueen työt, reunakivetyksiä yms Vko 40/41
- Sääsuojan purkutyöt vk 40 ti-ke aloitus
- Julkisivujen lasituksen sääsuojan jälkeen Vko 41
- Hissiasennukset vko 45
- R2 1krskäytävien lattioiden hionnat vko 40

Työturvallisuus

TR-mittaus vko 38 97,89 %


TR-mittarin avulla arvioidaan rakennustyömaan työturvallisuutta. Lyhenne "TR" tulee sanasta talonrakennus.

Työmaan terveiset

Työt etenevät aikataulun mukaisesti.

LAPTI

**SA
VI
LAH
TI.**
KUOPIO
FINLAND

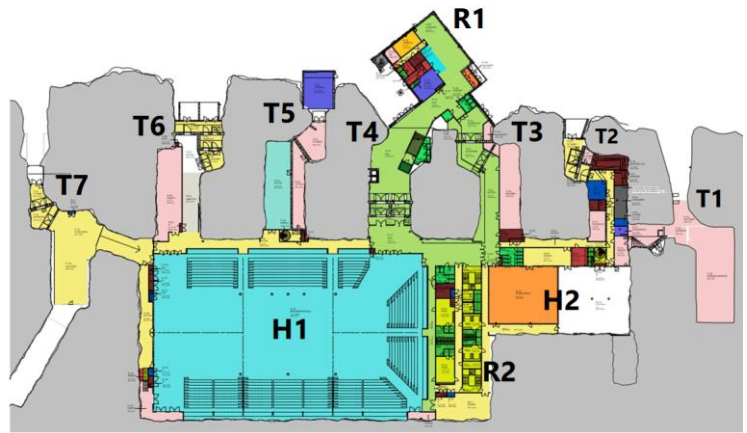

Aluemerkinät

T1 - T7	=	Tunnelit 1-7
R1	=	Rakennus 1 (sisääkäyntirakennus)
R2	=	Rakennus 2
H1	=	Halli 1
H2	=	Halli 2


VIKKOTIEDOTE



Kuva 1 T4 hissikuilut, hissien asennus alkavana työvaiheena

LAPTI

**SA
VI
LAH
TI.**
KUOPIO
FINLAND

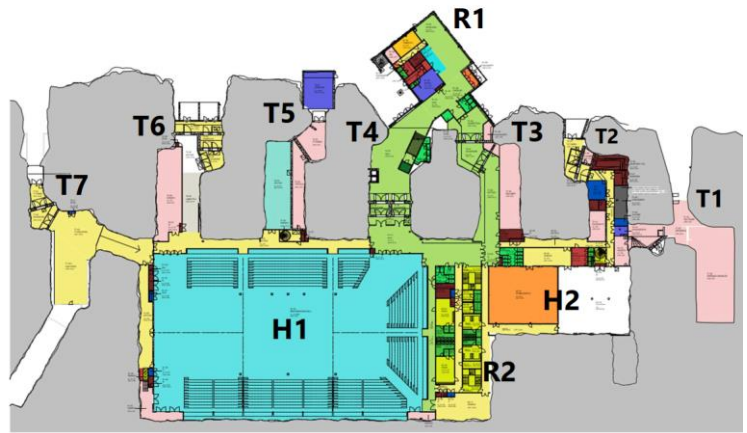

Aluemerkinnt

T1 - T7	=	Tunnelit 1-7
R1	=	Rakennus 1 (sisäänkäyntirakennus)
R2	=	Rakennus 2
H1	=	Halli 1
H2	=	Halli 2

VIKKOTIEDOTE



Kuva 2 H1 yleiskuvaa
