

LAPTI

**SA
VI
LAH
TI.**
KUOPIO
FINLAND



Aluemerkinnät			
T1 - T7	=	Tunnelit 1-7	
R1	=	Rakennus 1 (sisäänkäyntirakennus)	
R2	=	Rakennus 2	
H1	=	Halli 1	
H2	=	Halli 2	

VIKKOTIEDOTE

LUOLA, Savilahden liikunta- ja tapahtumakeskus Vko 41/2023

Työmaatilanne


2. vaiheen työt käynnissä

Käynnissä olevat työvaiheet

- H1 +T1-T3 Kattojen vesivuotojen injektoinnit
- H1 Yhteiskannatuksen yläpuolisen Savusulkuseinän asennustyöt
- H1 IV asennukset ja eristystyöt
- H1 Sähköasennukset ja hyllyasennus
- H2 1krs WC tilojen Vedeneristys- ja laatoitustyöt
- H2-R2 1-2Krs Sähköasennukset ja hyllyasennus
- R2 1-3Krs ja H2 1-2Krs Palokatkosauemukset
- R2 1Krs Betonilattioiden hionta ja kiilloitus sekä pinnoitustyöt
- R2 2Krs Sos tilojen lattioiden pinnoitustyöt
- R2 1-2Krs Aulan ja porraskäytävän LVI asennukset
- R2 1-3Krs LVI eristystyöt
- R1 Julkisivun sokkelin muotti- ja raudoitustyöt
- R1 1Krs Maalaus ja tasoitetyöt
- R1 Julkisivulasitus
- R1 Ulkopuolen teräsportaan ja huoltotason asennus
- R1 Tunneli 3 ja 4 kohdalla ulkopuolisten betonikauluksien muotti- ja raudoitustyöt
- H2-R2 1-2Krs Sähköasennukset ja hyllyasennus
- Tunneli 1 Jälkiasennettavien Vss läpivientien asennus
- Tunneli 2 LV asennukset
- Tunneli 3 Lämmönjakuhuoneen asennukset
- Tunneli 4 1-2Krs LV ja 3Krs IV asennukset
- Tunnelit 2-4 Sprinkleri asennukset

LAPTI

**SA
VI
LAH
TI.**
KUOPIO
FINLAND

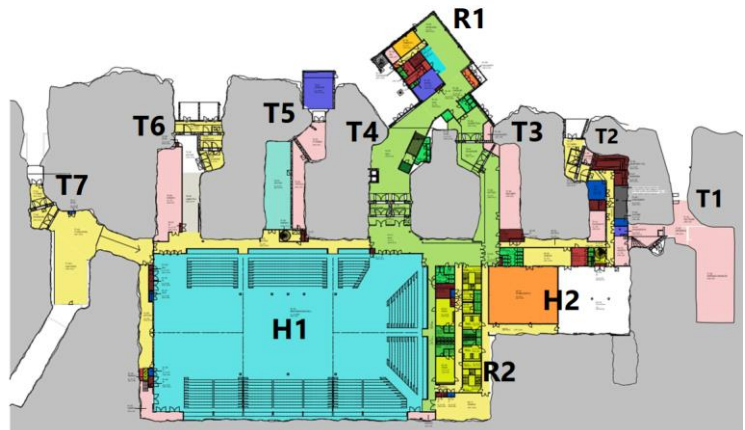

Aluemerkinnt

T1 - T7	=	Tunnelit 1-7
R1	=	Rakennus 1 (sisäänkäyntirakennus)
R2	=	Rakennus 2
H1	=	Halli 1
H2	=	Halli 2

VIKKOTIEDOTE

- Tunneli 6 Sisäänkäynti katoksen kermityöt
- Tunneli 6 800mm paksun VSS seinän tartuntojen poraus (viimeinen osa seinää)
- Tunneli 7 LV ja Spr asennukset
- Pihan kaivuutyöt sekä tekniikan asennus Tunneleiden 6-7 välinen alue
- Pihan profilointityöt tunneleiden 1-3 edessä ja sähkökaapelointi piha-alueelle

Alkavat työvaiheet

- Piha-alueen työt, reunakivetyksiä yms Vko 41-42
- R1 Julkisivun metalliverhouksen asennus Vko 42
- H1 lattioiden hionta Vko 43-44
- Paffle asennus H1 kattoon Vko 43 alk
- T4 Paroc asennus vk 42
- Tunneleiden muuraustyöt Lokakuun lopussa

Työturvallisuus

TR-mittaus vko 40 97,98 %


TR-mittarin avulla arvioidaan rakennustyömaan työturvallisuutta. Lyhenne "TR" tulee sanasta talonrakennus.

Työmaan terveiset

Työt etenevät aikataulun mukaisesti.

LAPTI

**SA
VI
LAH
TI.**
KUOPIO
FINLAND

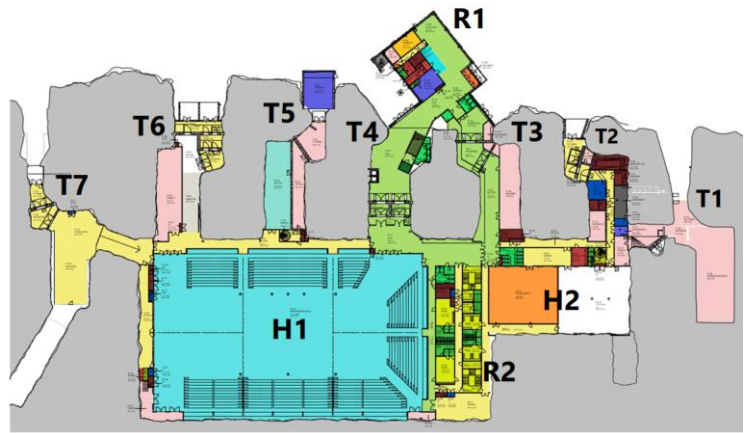

VIKKOTIEDOTE

Aluemerkinnt


T1 - T7	=	Tunnelit 1-7
R1	=	Rakennus 1 (sisäänkäyntirakennus)
R2	=	Rakennus 2
H1	=	Halli 1
H2	=	Halli 2



Kuva 1 R1 ikkuna-asennukset alkaneet viikolla 41

LAPTI

**SA
VI
LAH
TI.**
KUOPIO
FINLAND

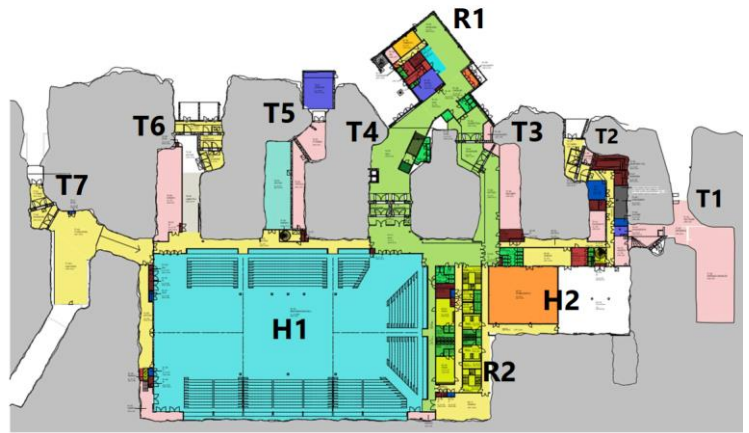

Aluemerkinnt

T1 - T7	=	Tunnelit 1-7
R1	=	Rakennus 1 (sisäänkäyntirakennus)
R2	=	Rakennus 2
H1	=	Halli 1
H2	=	Halli 2

VIKKOTIEDOTE



Kuva 2 R1 alueella seinälaatoitukset käynnissä
