


# LAPTI

**SA  
VI  
LAH  
TI.**  
KUOPIO  
FINLAND

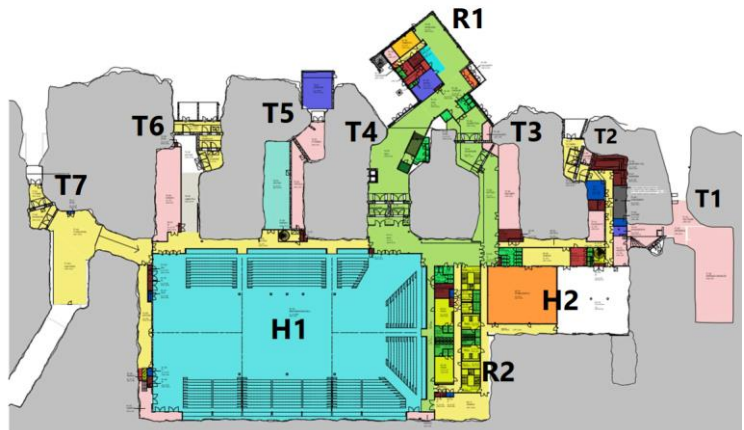

#### Aluemerkinnt

T1 - T7	=	Tunnelit 1-7
R1	=	Rakennus 1 (sisäänkäyntirakennus)
R2	=	Rakennus 2
H1	=	Halli 1
H2	=	Halli 2

## VIKKOTIEDOTE

### LUOLA, Savilahden liikunta- ja tapahtumakeskus Vko 42/2023

#### Työmaatilanne


#### 2. vaiheen työt käynnissä

#### Käynnissä olevat työvaiheet

- H1 +T1-T3 Kattojen vesivuotojen injektioinnit
- H1 Yhteiskannatuksen yläpuolisen Savusulkuseinän asennustyöt
- H1 IV asennukset ja eristystyöt
- H1 Sähköasennukset ja hyllyasennus
- H2-R2 1-2Krs Sähköasennukset ja hyllyasennus
- R2 1-3Krs ja H2 1-2Krs Palokatkosaumaukset
- R2 1Krs Betonilattioiden hionta ja kiilloitus sekä pinnoitustyöt
- R2 2Krs Sos tilojen lattioiden pinnoitustyöt
- R2 1-2Krs Aulan ja porraskäytävän LVI asennukset
- R2 1-3Krs LVI eristystyöt
- R1 Julkisivun metalliverhouksen runkojen asennus
- R1 Tunneli 3 ja 4 kohdalla ulkopuolisten betonikauluksien muotti- ja raudoitustyöt
- H2-R2 1-2Krs Sähköasennukset ja hyllyasennus
- Tunneli 1 Jälkiasennettavien Vss läpivientien asennus
- Tunneli 2 LV asennukset
- Tunneli 3 Lämmönjakuhuoneen asennukset
- Tunneli 4 1-2Krs LV ja 3Krs IV eristykset
- Tunnelit 2-4 Sprinkleri asennukset
- Tunneli 6 800mm paksun VSS seinän muotti- ja raudoitustyöt sekä läpivientien asennus
- Tunneli 7 LV ja Spr asennukset
- Pihan profilointityöt tunneleiden 1-3 edessä ja sähkökaapelointi piha-alueelle

# LAPTI

**SA  
VI  
LAH  
TI.**  
KUOPIO  
FINLAND

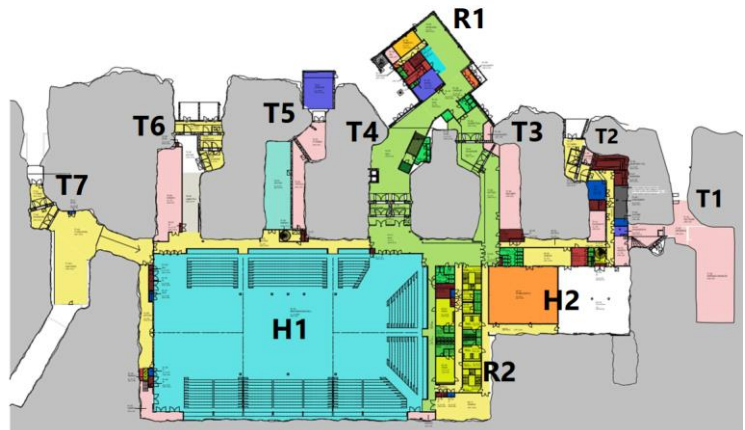

#### Aluemerkinnt

T1 - T7	=	Tunnelit 1-7
R1	=	Rakennus 1 (sisäänkäyntirakennus)
R2	=	Rakennus 2
H1	=	Halli 1
H2	=	Halli 2

## VIKKOTIEDOTE

### Alkavat työvaiheet

- Piha-alueen työt, reunakivetyksiä yms Vko 43 Ma
- H1 lattioiden hionta Vko 43
- Paffle asennus H1 kattoon Vko 43 alk
- Tunneleiden muuraustyöt Vko 43 lopulla
- T6 kipsilevyseinien työt Vko 45 alk

### Työturvallisuus

TR-mittaus vko 41 95,66 %


TR-mittarin avulla arvioidaan rakennustyömaan työturvallisuutta. Lyhenne "TR" tulee sanasta talonrakennus.

### Työmaan terveiset

Työt etenevät aikataulun mukaisesti. Työmaalla on aloitettu valmistelut talven tuloa varten.

# LAPTI

**SA  
VI  
LAH  
TI.**  
KUOPIO  
FINLAND

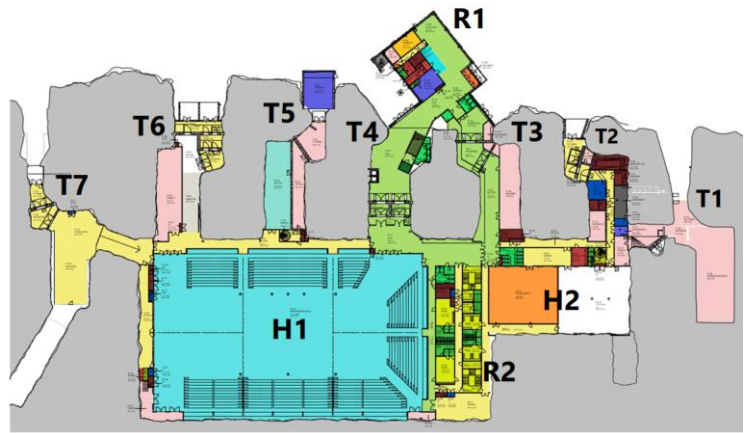

#### Aluemerkinnät

T1 - T7

R1

R2

H1

H2

=

=

=

=

=

Tunnelit 1-7

Rakennus 1 (sisäänkäyntirakennus)

Rakennus 2

Halli 1

Halli 2

## VIKKOTIEDOTE




Kuva 1 R1 ulkopuolen IV-konehuoneeseen menevä teräsporras asennettu



# LAPTI

**SA  
VI  
LAH  
TI.**  
KUOPIO  
FINLAND

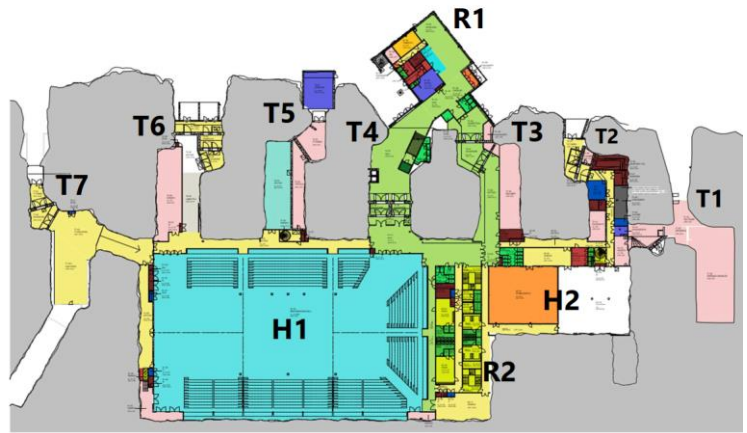

#### Aluemerkinnt

T1 - T7

R1

R2

H1

H2

=

=

=

=

=

Tunnelit 1-7

Rakennus 1 (sisäänkäyntirakennus)

Rakennus 2

Halli 1

Halli 2

## VIKKOTIEDOTE



*Kuva 2 R2 ja H2 käytävien betonilattioita hiottu ja hiontatöiden jälkeen lattiat suojattu*
