


# LAPTI

**SA  
VI  
LAH  
TI.**  
KUOPIO  
FINLAND

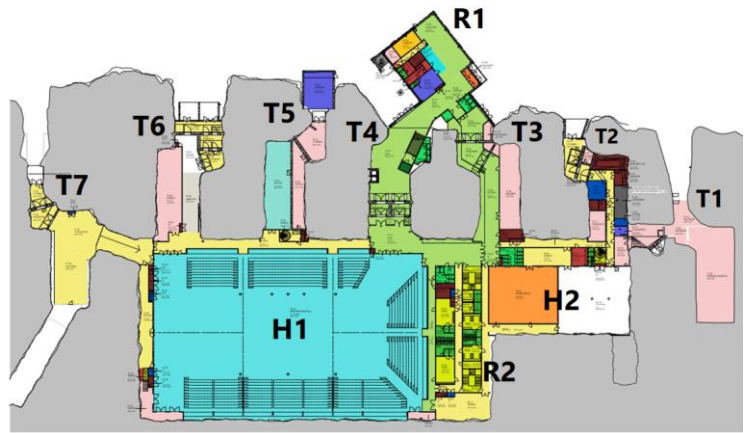

Aluemerkinnt		
T1 - T7	=	Tunnelit 1-7
R1	=	Rakennus 1 (sisäänkäyntirakennus)
R2	=	Rakennus 2
H1	=	Halli 1
H2	=	Halli 2

## VIKKOTIEDOTE

### LUOLA, Savilahden liikunta- ja tapahtumakeskus Vko 43/2023

#### Työmaatilanne


#### 2. vaiheen työt käynnissä

#### Käynnissä olevat työvaiheet

- H1 +H2 +T1-T3 Kattojen vesivuotojen injektoinnit
- H1 Yhteiskannatuksen yläpuolisen Savusulkuseinän asennustyöt
- H1 IV asennukset ja eristystyöt
- H1 Sähköasennukset ja hyllyasennus
- H1 Metallilasiseinän asennus
- H1 1Krs Parven alla Betonilattioiden hionta ja kiilloitus sekä pinnoitustyöt
- H2-R2 1-2Krs Sähköasennukset ja hyllyasennus
- H2, R2 ja T2 Sähkö ja teletilojen mattotyöt
- R2 1-3Krs ja H2 1-2Krs Palokatkosaumaukset
- R2 2Krs Sos tilojen lattioiden pinnoitustyöt
- R2 1-2Krs Aulan ja porraskäytävän LVI asennukset
- R2 1-3Krs LVI eristystyöt
- R1 Tuulikaapin katon koolaus ja eristystyöt
- R1 Julkisivun metalliverhouksen runkojen asennus
- R1 Tunneli 3 ja 4 kohdalla ulkopuolisten betonikauluksien muotti- ja raudoitustyöt
- H2-R2 1-2Krs Sähköasennukset ja hyllyasennus
- Tunneli 1 Jälkiasennettavien Vss läpivientien asennus
- Tunneli 2 LV ja sähkö asennukset
- Tunneli 3 Lämmönjakohuoneen asennukset ja IV kanava asennukset+eristykset
- Tunneli 4 1-2Krs LV ja 3Krs IV eristykset
- Tunnelit 2,3,4,6 Sprinkleri asennukset
- Tunneli 5 Ulkoseinän Harkkomuuraus

# LAPTI

**SA  
VI  
LAH  
TI.**  
KUOPIO  
FINLAND

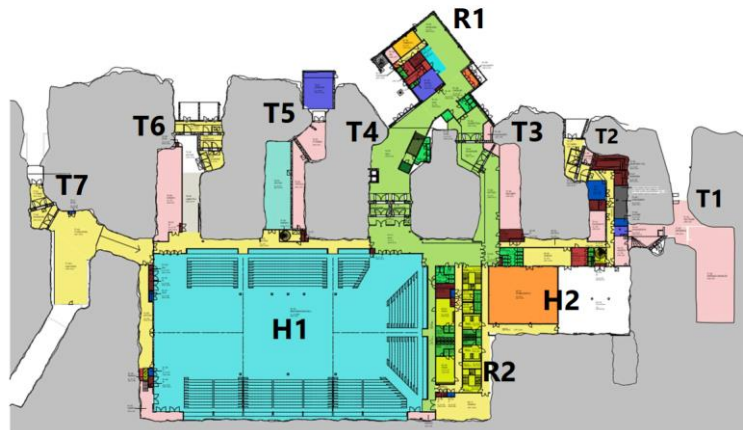

#### Aluemerkinnt

T1 - T7	=	Tunnelit 1-7
R1	=	Rakennus 1 (sisäänkäyntirakennus)
R2	=	Rakennus 2
H1	=	Halli 1
H2	=	Halli 2

## VIKKOTIEDOTE

- Tunneli 7 LV ja Spr asennukset
- Pihatyöt Tunneleiden 1-3 edustalla (reunakivien asennus)

### Alkavat työvaiheet

- T6 kipsilevyseinien työt Vko 45 alk
- H1 Akustikkaseinien asennus Vko 45 alk
- H2 ja R2 alueiden Metallin ja puuvien asennus Vko 46 alk

### Työturvallisuus

TR-mittaus vko 43 98,33 %


TR-mittarin avulla arvioidaan rakennustyömaan työturvallisuutta. Lyhenne "TR" tulee sanasta talonrakennus.

### Työmaan terveiset

Työt etenevät aikataulun mukaisesti.

# LAPTI

**SA  
VI  
LAH  
TI.**  
KUOPIO  
FINLAND

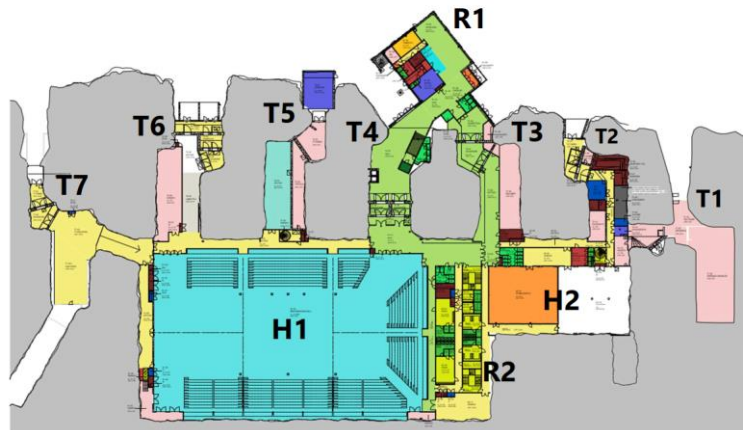

## VIKKOTIEDOTE

### Aluemerkinnät

T1 - T7 =

R1 =

R2 =

H1 =

H2 =

Tunnelit 1-7

Rakennus 1 (sisäänkäyntirakennus)

Rakennus 2

Halli 1


Halli 2



*Kuva 1 R1 teräsovia asennettu ja piha-alueen työt käynnistyneet reunakivien asentamisella*

# LAPTI

**SA  
VI  
LAH  
TI.**  
KUOPIO  
FINLAND

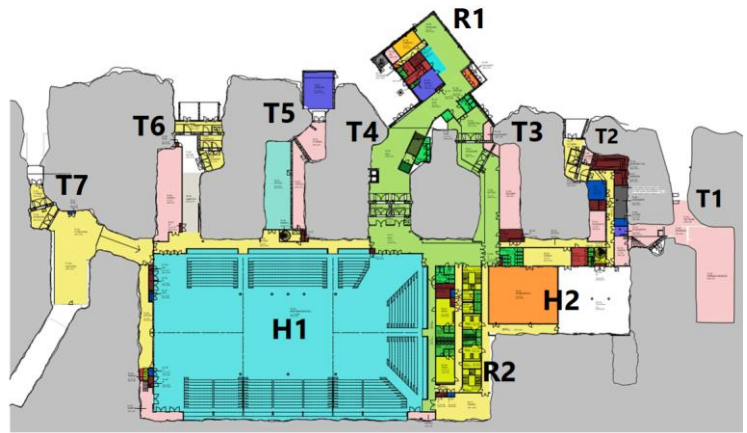

#### Aluemerkinnät

T1 - T7

R1

R2

H1

H2

=

=

=

=

=

Tunnelit 1-7

Rakennus 1 (sisäänkäyntirakennus)

Rakennus 2

Halli 1

Halli 2

## VIKKOTIEDOTE



Kuva 2 R2 ja H2 alueella LV kalustus alkamassa
