


LAPTI

**SA
VI
LAH
TI.**
KUOPIO
FINLAND

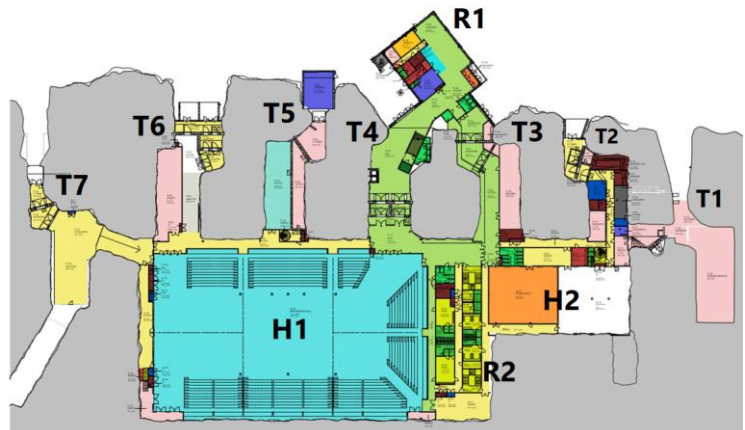

Aluemerkinnt		
T1 - T7	=	Tunnelit 1-7
R1	=	Rakennus 1 (sisäänkäyntirakennus)
R2	=	Rakennus 2
H1	=	Halli 1
H2	=	Halli 2

VIKKOTIEDOTE

LUOLA, Savilahden liikunta- ja tapahtumakeskus Vko 44/2023

Työmaatilanne

2. vaiheen työt käynnissä

Käynnissä olevat työvaiheet


- H1 + T1-T3 Kattojen vesivuotojen injektoinnit
- H1 Yhteiskannatuksen yläpuolisen Savusulkuseinän asennustyöt
- H1 IV asennukset ja eristystyöt
- H1 Sähköasennukset ja hyllyasennus sekä valaisin asennukset
- H1 Metallilasiseinän asennus
- H1 Akustiikkalevyjen asennus
- H2-R2 1-2Krs Sähköasennuksien kalustus ja viimeistelyt
- R2 2Krs Betonilattioiden hionta ja kiilloitus sekä pinnoitustyöt
- R2 1-3Krs ja H2 1-2Krs Palokatkosaukaukset
- R2 1-2Krs Aulan ja porraskäytävän LVI asennukset
- R2 3Krs LVI eristystyöt
- R1 Kahvilasalin seinien tasoite- ja maalaustyöt
- R1 Tunneli 4 kohdalla ulkopuolisten betonikauluksien muotti- ja raudoitustyöt
- Tunneli 2 LV ja sähkö asennukset
- Tunneli 3 Lämmönjakohuoneen asennukset ja IV kanava asennukset+eristykset
- Tunneli 4 1-2Krs LV asennukset ja 3Krs IV eristykset
- Tunnelit 2,4,6 Sprinkleri asennukset
- Tunneli 7 Ulkoseinän Harkkomuuraus

Alkavat työvaiheet

- T6 kipsilevyseinien työt Vko 45 alk
- H1 Akustiikkaseinien asennus Vko 45 alk

LAPTI

**SA
VI
LAH
TI.**
KUOPIO
FINLAND

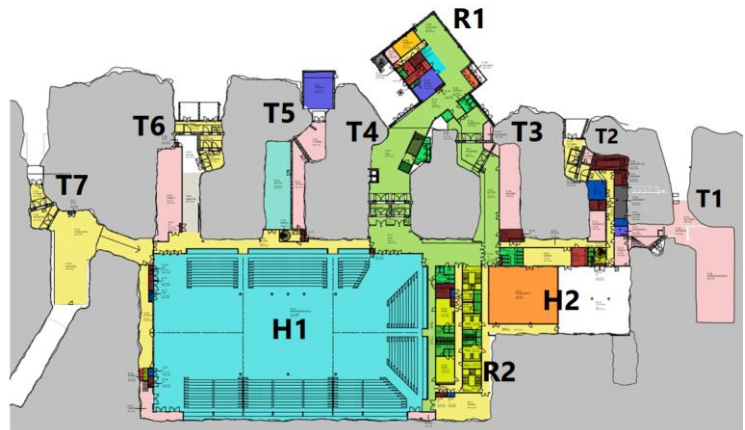

Aluemerkinnt

T1 - T7 =
R1 =
R2 =
H1 =
H2 =

Tunnelit 1-7

Rakennus 1 (sisäänkäyntirakennus)
Rakennus 2
Halli 1
Halli 2

VIKKOTIEDOTE

- H2 ja R2 alueiden Metallin ja puuvien asennus Vko 46 alk
- Hissi asennus Vko 46 alk
- Lukitus ja heloitus työt Vko 46 alk

Työturvallisuus

TR-mittaus vko 44 96,69 %


TR-mittarin avulla arvioidaan rakennustyömaan työturvallisuutta. Lyhenne "TR" tulee sanasta talonrakennus.

Työmaan terveiset

Työt etenevät aikataulun mukaisesti talven tulosta huolimatta.

LAPTI

**SA
VI
LAH
TI.**
KUOPIO
FINLAND

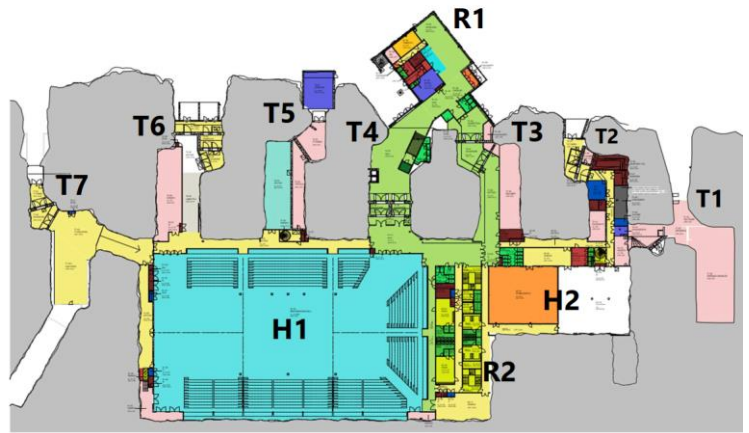

VIKKOTIEDOTE

Aluemerkinnt

T1 - T7 =
R1 =
R2 =
H1 =
H2 =

Tunnelit 1-7


Rakennus 1 (sisäänkäyntirakennus)
Rakennus 2
Halli 1
Halli 2



Kuva 1 H1 alueella akustoivat Paffle asennukset käynnissä

LAPTI

**SA
VI
LAH
TI.**
KUOPIO
FINLAND

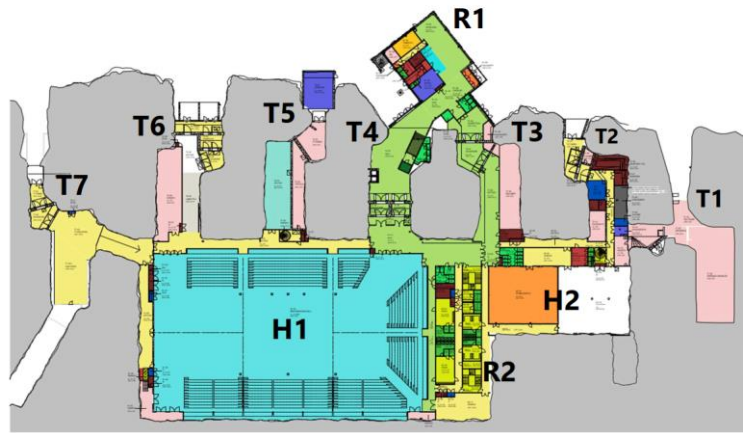

VIKKOTIEDOTE

Aluemerkinnät

T1 - T7 =
R1 =
R2 =
H1 =
H2 =


Tunnelit 1-7
Rakennus 1 (sisäänkäyntirakennus)
Rakennus 2
Halli 1
Halli 2



Kuva 2 R2 alueella on tehty malliasennus LV kalustuksesta

LAPTI


**SA
VI
LAH
TI.**
KUOPIO
FINLAND

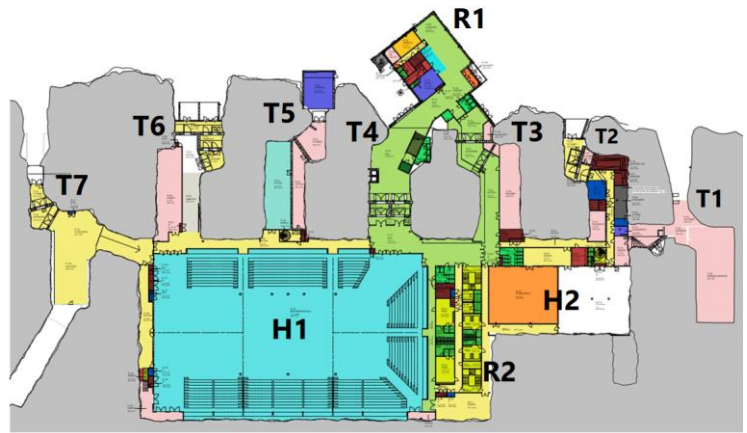

VIKKOTIEDOTE

Aluemerkinät

T1 - T7	=	Tunnelit 1-7
R1	=	Rakennus 1 (sisäänkäyntirakennus)
R2	=	Rakennus 2
H1	=	Halli 1
H2	=	Halli 2

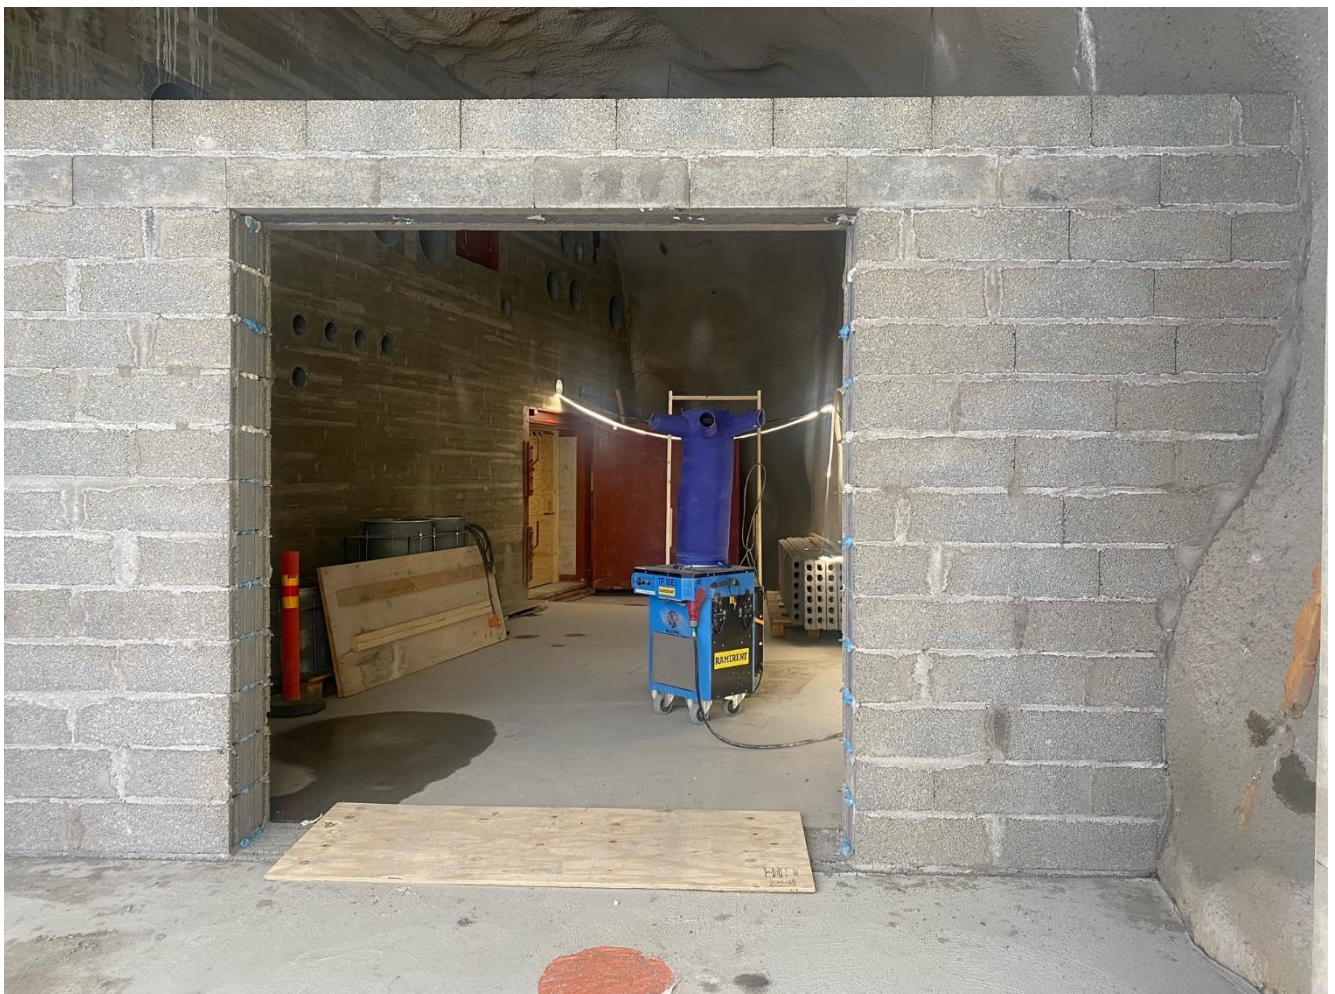

Kuva 3 Tunneleiden suuaukoilla on muurattu ulkoseiniä
